




PROJETO MONITORAMENTO
CERRADO

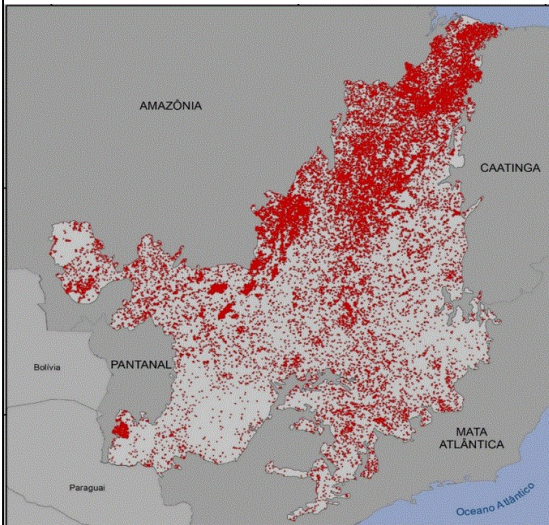

Focos de Calor no Bioma Cerrado (1998-2017)

Fonte: <http://www.inpe.br/queimadas>

PAINEL DE MONITORAMENTO DA EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DOS RECURSOS FIP

Atualizado em 30/09/2018

Título do Projeto:

Desenvolvimento de Sistemas de Prevenção de Incêndios Florestais e Monitoramento da Cobertura Vegetal no Cerrado Brasileiro


Início da Execução

23/05/2016


Término da Execução

29/05/2020

% Período de Execução Decorrido



Evolução Histórica da Execução Orçamentária e Financeira
(Recursos FIP - Em US\$)



Orçamento Total
(Recursos FIP)
(Em US\$)

9.250.000,00

Índice de Execução
Financeira Global
(Recursos FIP)

23,34%

Execução Financeira por Componente
(Recursos FIP - Em US\$)



Componente 1;

1.104.293,55 ;

11,94%

Componente 2;

624.594,00 ;

6,75%

Componente 3;

354.937,57 ;

3,84%

Reservas;

74.956,50 ; ...

Componente 1 - Monitoramento do Desmatamento

Componente 2 - Sit. Inform. Risco de Incêndios Florestais e Estimativas de Emissões de GEE

Componente 3 - Gestão, Monitoramento e Avaliação do Projeto

Indicadores de Execução Física



Indicador

Meta

Situação Atual

1. Órgãos governamentais responsáveis pela formulação de políticas públicas, controle do desmatamento e prevenção de incêndios florestais	15	14
2. Mapas anuais de desmatamento na escala 1:250.000 disponíveis para o público (PRODES- Cerrado) (Numérico)	4	3
3. Dados de desmatamento na escala 1:500.000 entregues diariamente a órgãos de controle do desmatamento e mensalmente ao público (DETER-Cerrado) (Numérico)	12	3
4. Novos produtos sobre o risco de fogo disponibilizados aos usuários em dispositivos de comunicação interativa (Numérico)	26	49
5. Dados online sobre o risco de ignição e espalhamento do fogo (FISC) publicados no site do INPE. (Percentual)	100%	0
6. Modelo off-line sobre risco de ignição e espalhamento do fogo (FISC) executado em regime experimental em áreas de conservação selecionadas (Numérico)	4	2
7. Relatórios independentes sobre a qualidade dos produtos do Projeto (Numérico)	3	0
